

GAS BUSTERS

**PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SENSORES DE GÁS EM
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS OFFSHORE**

Orientadores: Fernando Brandão e Clara Salomão

ENRICO FARALDO (RA: 04251138)

Renan Antonini Pereira (RA: 04251017)

Rafael Mechi de Oliveira – (RA: 04251039)

Henry Caetano Marcolino Silva - (RA: 04251049)

Davi Santana Nunes da Silva – (RA: 04251023)

SÃO PAULO

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS	TÍTULO	PÁG
Figura 1 -	Plataforma Offshore	4
Figura 2 -	Mapa do pré-sal	5
Figura 3 -	Repartição da oferta interna de energia no Brasil	5
Figura 4 -	PIB industrial brasileiro	6
Figura 5 -	Cimentação do poço	7
Figura 6 -	Acidente na plataforma E-KU-A2	8
Figura 7 -	Acidente Piper Alpha	8
Figura 8 -	Acidente na plataforma P-36 na petrobras	9
Figura 9 –	Trello	14
Figura 10 -	Backlog	15
Figura 11 -	Gráfico de Burndown	16
Figura 12-	Diagrama de visão de negócio	17
Figura 13-	Diagrama de solução técnica	18

SUMÁRIO

1. CONTEXTO.....	4
2. OBJETIVO.....	10
3. JUSTIFICATIVA.....	11
4. ESCOPO.....	12
4.1. PREMISSAS.....	12
4.2. RESTRIÇÕES.....	13
5. BACKLOG TRELLO.....	14
6. BACKLOG EXCEL.....	15
7. METODOLOGIA PRATICADA (SCRUM).....	16
8. MATRIZ DE PLANEJAMENTO (5w2h).....	16
9. DIAGRAMA DE NEGÓCIO.....	17
10. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO TÉCNICA.....	17
11. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES.....	18
12. REFERÊNCIAS.....	18

1. CONTEXTO

A indústria do petróleo é uma das mais importantes do mundo devida importância do produto para a sociedade, seja pela geração de energia, alimentação de veículos automobilísticos dentre outros. Uma das etapas do processo é a extração, que ocorre em plataformas tanto no continente, com as plataformas onshore, quanto no oceano com as plataformas offshore (FIGURA 1). Essa última será o foco deste projeto.

FIGURA 1 — PLATAFORMA OFFSHORE




FONTE: P&Q Engenharia Jr. (2017)

A produção de petróleo offshore representa 95% do petróleo e do gás natural do Brasil. Isso significa que foram gerados cerca de R\$120 bilhões somente em 2022.

Ao todo, foram cerca de 6 mil poços terrestres contra 500 poços marítimos. Apesar da discrepância entre ambos os métodos terrestres e marítimos, os poços nas águas são muito mais ricos e eficientes. Isso se dá pelo fato do pré-sal, formação geológica localizada nas águas do sudeste brasileiro representar cerca de 14 bilhões de litros de petróleo.

FIGURA 4 – PIB INDUSTRIAL BRASILEIRO

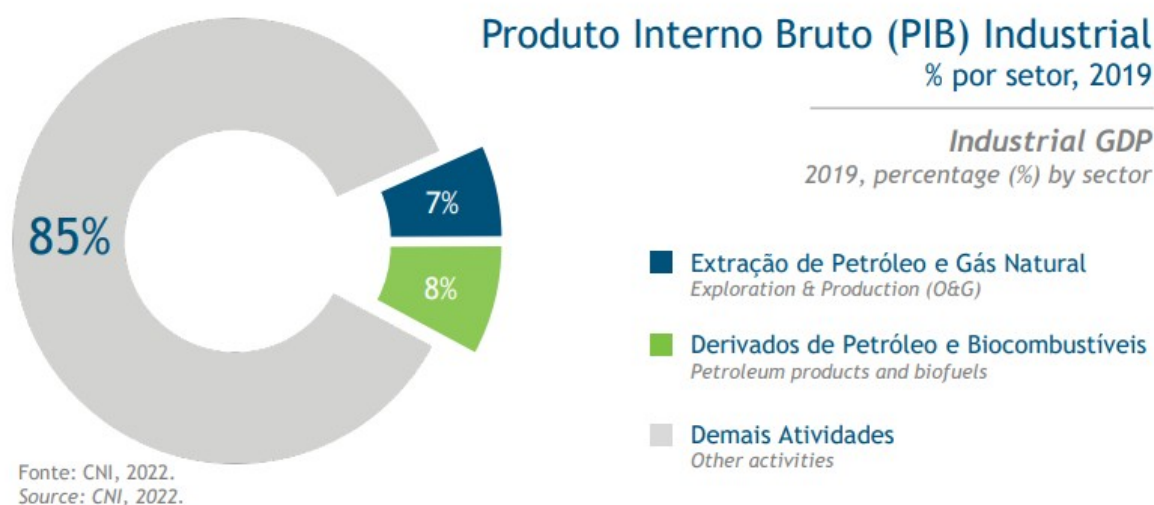


FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS

Entretanto, as indústrias petrolíferas enfrentam desafios como condições climáticas extremas, logística complexa, custos elevados de manutenção etc. Porém, um problema em específico pode gerar acidentes fatais e destruição completa da plataforma: explosões provenientes de gases vazados.

Com o passar dos anos, estudos foram feitos para examinar as causas dos acidentes e as conclusões apontam para relações diversas no ambiente de trabalho, nas quais pequenos equívocos podem gerar efeitos em cascata, resultando nos acidentes. Um desses equívocos envolve o vazamento de gases inflamáveis na etapa da sedimentação e posterior sucção dos hidrocarbonetos no poço cavado.

Para extrair o petróleo, primeiramente é necessário perfurar o solo subaquático com uma broca, processo esse denominado “spudding in”, e depois de atingir a profundidade correta, sedimentar o exterior do buraco com cimento para estabilizar a pressão e impedir vazamentos.

FIGURA 5 — CIMENTAÇÃO DO POÇO

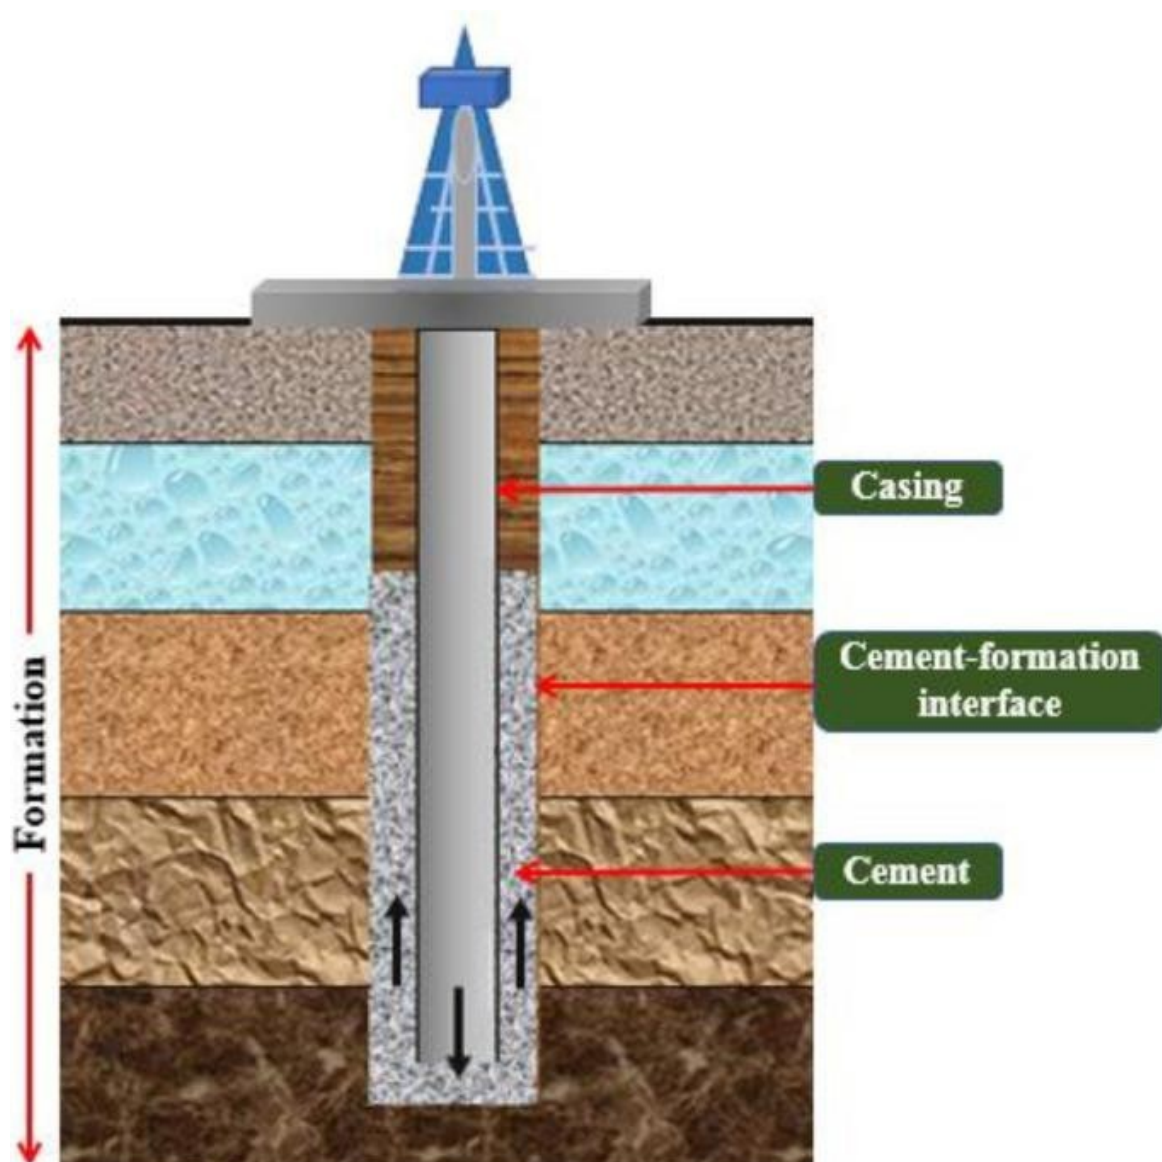

FONTE: Mtaki T (2020, p. 2)

Nesse processo, caso a cimentação seja feita incorretamente, o gás pode acumular muita pressão e extravasar para a plataforma.

Veja a seguir imagens de catástrofes em plataformas petrolíferas provenientes de vazamentos de gás:

FIGURA 6 – ACIDENTE NA PLATAFORMA E-KU-A2



FONTE: CPG

FIGURA 7 – ACIDENTE PIPER ALPHA



FONTE: OIL SPILL RESPONSE

FIGURA 8 – ACIDENTE NA PLATAFORMA P-36 PETROBRÁS



FONTE: GOVERNO DO ESTADO

Diante desse infortúnio, nós da Gas Busters desenvolvemos uma solução IoT integrado a um banco de dados e uma aplicação web para monitoramento de possíveis vazamentos de gases em plataformas petrolíferas.

Será utilizado sensores MQ-2 conectados a Arduinos para o monitoramento. Os sensores serão conectados à internet e, por meio de uma API (Application Programming Interface) própria da empresa Gas Busters, armazenarão seus dados em um banco de dados relacional do tipo SQL Server, que ficará hospedado em uma máquina virtual (VM) de sistema operacional Ubuntu.

Os dados do banco poderão ser visualizados de forma simples, rápida e intuitiva através da dashboard localizada no site institucional. Nele os funcionários podem se cadastrar e logar para ver os dados, bem como calcular a economia que a empresa terá com o projeto na calculadora financeira do site.

2.OBJETIVO

O objetivo é reduzir em 50% os riscos de acidentes nas plataformas petrolíferas provenientes de vazamento de gás e seus prejuízos a partir do primeiro ano de sua implementação.

3. JUSTIFICATIVA

O projeto consegue economizar mais de R\$77 milhões em média com vazamentos de gás e petróleo em plataformas offshore por ano, poupando, se for efetivado, bem como prevenir perdas irreparáveis nas unidades em cerca de USD 3 bilhões em média por plataforma, e vidas humanas.

4. ESCOPO

O projeto trabalha acerca de plataformas de petróleo do tipo offshore e gases inflamáveis que podem escapar dos poços de escavação nelas e não comporta outros setores da indústria petroquímica até mesmo plataformas onshore.

Pretende-se criar um sistema automatizado centrado na coleta de dados realizada pelo sensor MQ-2 montado em Arduino. Os dados ficarão armazenados no banco de dados do tipo SQL Server criado pela Gas Busters, armazenado em uma máquina virtual, e poderão ser consultados pela equipe para auxiliar a tomada de decisões.

Requisitos: Arduino montado com sensor MQ-2, API funcional, VM Lubuntu instalada com banco de dados SQL Server instalado dentro, documentação do projeto, diagrama de visão de negócio, diagrama de solução, script de inserção de dados, backlog.

4.1. PREMISSAS

- É necessário que o local onde serão instalados os sensores tenha energia elétrica de pelo menos 110 volts;
- É necessário que tenha uma internet de pelo menos 20 MB/s;
- É necessário que tenha um computador i5 com Windows 10 ou mais recente com processador de arquitetura de 64 bits;
- É necessário que o sensor seja mantido conectado na tomada 24 horas por dia;
- É necessário que seja instalado mais de um sensor em pontos estratégicos que dependem do modelo da plataforma;
- É necessária a compra dos sensores MQ-2 conforme a quantidade estabelecida;
- É necessária a manutenção constante por parte da equipe para garantir o funcionamento adequado dos sensores;
- A equipe deve ser treinada para utilizar o banco de dados e consultar os valores caso preciso;

4.2. RESTRIÇÕES

- Para o sensor iniciar o seu bom funcionamento, o sensor precisa de um período entre 24 e 48 horas em um ambiente de ar controlado antes de iniciar a detecção precisa dos gases;
- O sensor é projetado para detectar apenas gases específicos, podendo não ser eficaz para a detecção de outros tipos de gases não programados;
- O sensor de gás só detecta o gás combustível que entra nele;
- O prazo de entrega do projeto vai até 26/05/2025;
- Os sensores precisam ser comprados pelo cliente.


5.BACKLOG TRELLO

O Trello foi utilizado para ordenar e designar tarefas para os membros do grupo.

Ele conta com buckets padrões do Kanban, além de outros dois representados pela ATA e o histórico de todas as atividades.

No atual momento do período da documentação, o Trello se encontra assim:

FIGURA 9: TRELLO

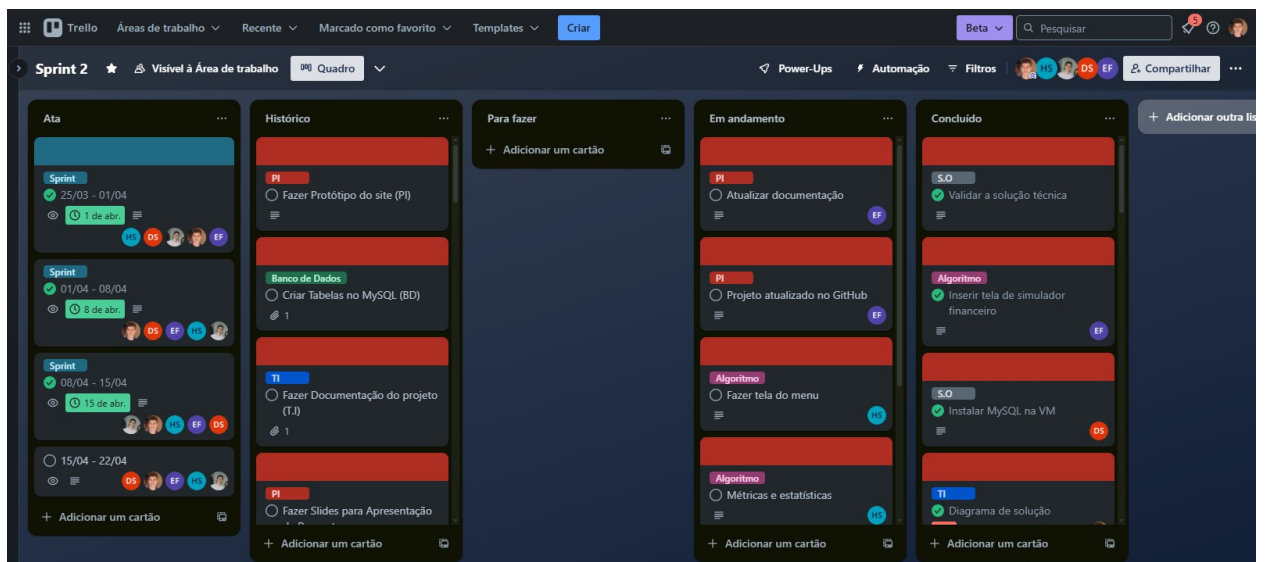

FONTE: AUTORAL

6. BACKLOG EXCEL

O backlog foi utilizado para organizar os requisitos do projeto.

Ele conta algumas colunas, sendo elas: Classificação (sendo Essencial, Importante ou Desejável), Sprint (para identificação de qual sprint aquele requisito é), Status (podendo ser A fazer, Fazendo ou Concluído), Prioridade (Para fazer a priorização dos requisitos, podendo ser 1, 2, 3 ou 4), Tamanho (Mostra a dificuldade dos requisitos, podendo ser de PP até GG fazendo esse serviço junto com o Fibonacci), Fibonacci (Define a dificuldade dos requisitos, podendo ser classificado por 3, 5, 8, 13 e 21) e Responsável (Que define o responsável de cada requisito)

No atual momento do período da documentação, o backlog se encontra assim:


FIGURA 10: BACKLOG

FONTE: AUTORAL

Matéria	Requisito	Descrição	Classificação	Sprint	Status	Prioridade	Tamanho	Fibonacci	Responsável
ALGORITMOS	Simulador Visão de Negócio	Tela de simulador financeiro (Individual) (Algoritmo)	Essencial	1	Concluído	1	G	13	Henry
ALGORITMOS	Inserir Tela do Simulador Financeiro	Inserir a tela do simulador financeiro no site estático	Essencial	2	Concluído	3	G	13	Enrico
ALGORITMOS	Menu	Fazer a tela do menu principal do site, com breve introdução	Importante	2	Concluído	2	GG	21	Henry
ALGORITMOS	Métricas e estatísticas	Fazer a página apresentando as taxas de vazamentos e acidentes antes e depois do monitoramento	Importante	2	Concluído	3	GG	21	Henry
ALGORITMOS	Cadastro do Usuário	Fazer a tela de cadastro do site	Essencial	2	Concluído	1	G	13	Renan
ALGORITMOS	Tela de Login	Fazer a tela para login do usuário através de email e senha	Essencial	2	Concluído	1	M	8	Renan
ALGORITMOS	Final do Site	Versão final do site completa	Essencial	3	A fazer	1	GG	21	Enrico
APIQ COMP	Circuito	Circuito no arduino completo e funcional	Essencial	1	Concluído	1	P	5	Davi
APIQ COMP	Arg Comp - Código	Código do arduino completo e calibrado com as devidas métricas	Essencial	1	Concluído	2	M	8	Henry
APIQ COMP	Ligar arduino	Ligar arduino	Essencial	1	Concluído	3	PP	3	Rafael
APIQ COMP	Simular utilização do sensor - gráfico	Simular utilização do sensor - gráfico	Essencial	2	Concluído	2	G	13	Davi
APIQ COMP	Configurar a API	Utilizar o sensor com API local	Essencial	2	Concluído	1	GG	21	Rafael
APIQ COMP	Dashboard	Teste integrado dashboard	Essencial	3	A fazer	3	GG	21	Davi
APIQ COMP	Aquino - BobiA	Data Aquino - BobiA (N)	Essencial	3	A fazer	1	GG	21	Enrico
APIQ COMP	IoT	Teste integrado da solução de IoT	Essencial	3	A fazer	2	GG	21	Henry
APIQ COMP	Integrado BD	Arduíno integrado com o Banco de Dados	Essencial	3	A fazer	1	GG	21	Rafael
BD	Tabelas criadas	Tabelas criadas no MySQL (BD)	Essencial	1	Concluído	1	M	8	Enrico
BD	Fazer Script Mysql Workbench	Script no MySQL server	Essencial	2	Concluído	3	M	8	Davi
BD	Modelagem vl	Modelagem lógica vl	Essencial	2	Concluído	2	G	13	Henry
BD	Reajustar o banco de dados	Fazer melhorias no Banco de Dados	Importante	2	Concluído	1	M	8	Henry e Davi
BD	MySQL Server Final	Script definitivo no MySQL server	Essencial	3	A fazer	4	GG	21	Henry
PI	Diagrama da Solução	União dos diagramas de visão de negócio realizados em dupla	Essencial	1	Concluído	2	M	8	Davi
PI	Projeto no GitHub	Projeto criado e configurado no GitHub	Essencial	1	Concluído	1	PP	3	Enrico
PI	Definir o nicho industrial	Definir o nicho industrial	Essencial	1	Concluído	1	PP	3	Rafael
PI	Slides	Slides para a apresentação da proposta	Essencial	1	Concluído	3	M	8	Rafael
PI	Protótipo do Site	Criar um protótipo das páginas contidas no site utilizando o Figma	Essencial	1	Concluído	1	M	8	Renan
PI	Fazer a Logo	Fazer a logo do Projeto	Importante	1	Concluído	4	PP	3	Renan
PI	Reajustar Diagrama de Negócio	Fazer melhorias ditas no Diagrama de Visão de Negócio	Importante	2	Concluído	1	M	8	Davi
PI	Criação novo Repositorio no GitHub	Criar um repositório no GitHub para armazenar todos códigos e documentos	Desejável	2	Concluído	1	PP	3	Enrico
PI	Iniciar Primeiros Registros da ATA	Fazer um template no trello para colocar todas as ATAs realizadas	Importante	2	Concluído	2	PP	3	Rafael
PI	Fazer Slides	Fazer os slides para a apresentação da segunda sprint	Importante	3	A fazer	1	P	5	Davi
SO	Validar a solução técnica	Validar a solução técnica	Essencial	2	Concluído	3	P	5	Davi
SO	Instalar MySQL na VM	Instalar o MySQL na VM	Essencial	2	Concluído	2	P	5	Davi
TI	Documentação	Documentação do projeto de PI no Word (Contexto, Obj., Justif, Escopo)	Essencial	1	Concluído	1	G	13	Henry
TI	Colocar Ferramenta de Gestão para funcionar	Colocar Ferramenta de Gestão para funcionar	Essencial	1	Concluído	1	P	5	Renan
TI	Atualizar Documentação	Atualizar documentação para melhor entendimento e para acrescentar informações	Importante	2	Concluído	3	M	8	Enrico
TI	Diagrama da Solução	Criação do diagrama da solução do projeto e dentro da documentação	Essencial	2	Concluído	2	G	13	Rafael
TI	Reajustar a Fazeres do Trello	Organizar o trello para melhor entendimento do grupo	Desejável	2	Concluído	1	G	13	Renan
TI	BackLog da Sprint	Separação do BackLog para a Sprint	Essencial	2	Concluído	1	P	5	Renan
TI	Fluxograma	Fluxograma do suporte	Essencial	3	A fazer	3	GG	21	Davi
TI	Mudança	Documento de mudança	Essencial	3	A fazer	4	G	13	Rafael
TI	Help Desk	Ferramenta de Help Desk	Essencial	3	A fazer	3	GG	21	Renan

Junto com o backlog possui o gráfico de burndown, que pega a soma dos pontos do Fibonacci e faz uma media para medir o esperado que aquela equipe entregue.

FIGURA 11: GRÁFICO DE BURNDOWN

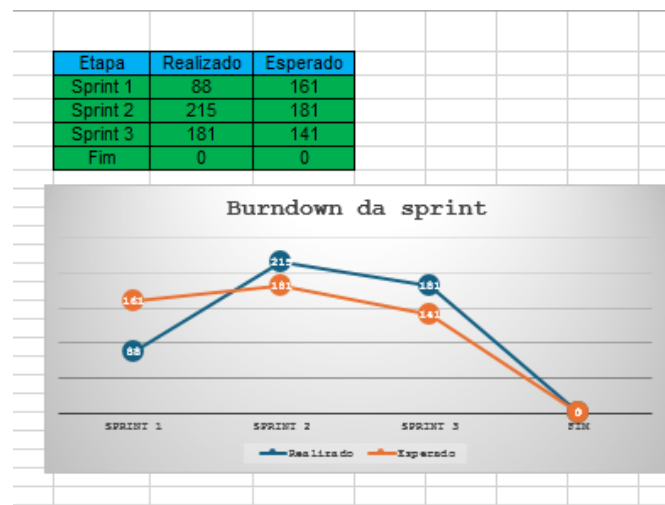

FONTE: AUTORAL

7. METODOLOGIA PRATICADA (SCRUM)

O projeto é desenvolvido seguindo a metodologia SCRUM, uma metodologia ágil que permite mais flexibilidade na produção e contato com o cliente. Nela, as entregas são parciais através de sprints e existem quatro pessoas que fazem parte do projeto, sendo elas: scrum master, product owner, equipe de desenvolvimento e cliente. Nesse projeto, os cargos foram alterados semanalmente seguindo um rodízio, sendo o cliente o único cargo imutável.


8. MATRIZ DE PLANEJAMENTO (5w2h)

O 5w2h consiste em sete perguntas cujas respostas revelam mais sobre o projeto. são elas: quando (when), onde (where), o quê (what), porque (why), quem (who), como (how), quanto (how much). Nesse projeto, as respostas são respectivamente: o prazo limite é 26/05/2025, o projeto ocorre em plataformas de petróleo offshore, o projeto visa a implementação de sensores MQ-2 para detecção de gases inflamáveis nas plataformas offshore, o projeto visa economizar com acidentes e vazamentos de gás, as pessoas envolvidas são os funcionários da plataforma e a empresa gas busters, os dados do sensor serão gravados no banco do tipo SQL dentro de uma máquina virtual Lubuntu e exibidos no site institucional através de uma dashboard e os custos serão combinados com o cliente.

9. DIAGRAMA DE NEGÓCIO

O diagrama de visão de negócio serve para exibir uma visão holística do projeto bem como a proposta de solução. Em relação a esse projeto, eis o diagrama abaixo.

FIGURA 12: DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO

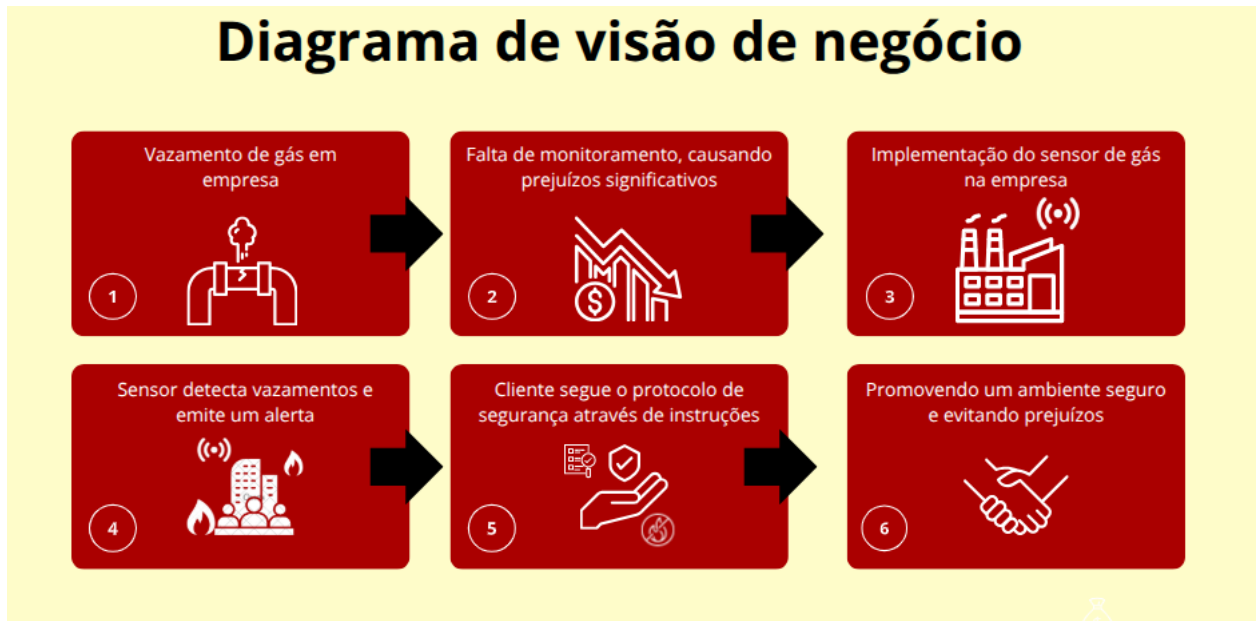


FONTE: AUTORAL

10. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO TÉCNICA

O diagrama de solução técnica se assemelha ao diagrama de solução de negócio no que tange à visão holística, porém com enfoque na parte técnica. O diagrama técnico desse projeto encontra-se logo abaixo.

FIGURA 13: DIAGRAMA DE SOLUÇÃO TÉCNICA

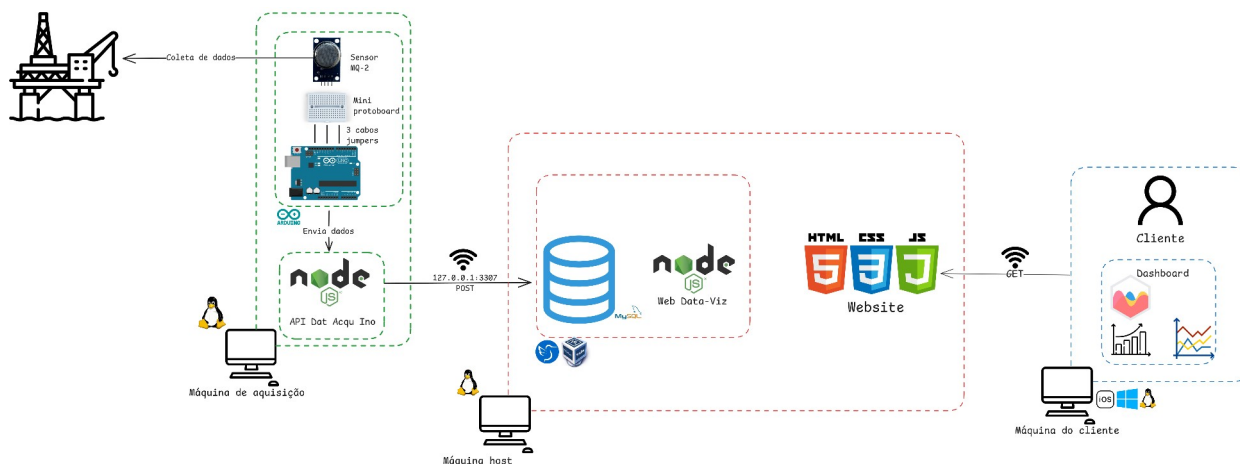

FONTE: AUTORAL

11. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

O projeto ainda não comporta integração entre site, sensor e banco de dados. Futuramente essa integração será efetivada.

12. REFERÊNCIAS

FIGUEIREDO, Marcelo Gonçalves; ALVAREZ, Denise; ROTENBERG, Lúcia; ADAMS, Ricardo Nunes. **O acidente da plataforma de petróleo Deepwater Horizon após 12 anos: análise com foco na dimensão coletiva do trabalho e nos fatores organizacionais.** 2022. 17p. Dissertação - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil; Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil; Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. 2022. DOI 10.1590/0102-311XPT222621. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/rnfrxmgLSkCNdnzH5fn4cLs/?lang=pt> Acesso em: 13 março 2025.

FIGUEIREDO, Marcelo Gonçalves; ALVAREZ, Denise; ADAMS, Ricardo Nunes. **O acidente da plataforma de petróleo P-36 revisitado 15 anos depois: da gestão de situações incidentais e acidentais aos fatores organizacionais.** 2018. 12p. Artigo - Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. DOI 10.1590/0102-311X00034617 Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/Z43R7kQWZ3Mpwvkr5LKzmJm/?lang=pt> Acesso em: 13 março 2025.

<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes-palestras/2023/arquivos/2023-06-26-rodolfo-saboia-offshore-week.pdf>

<https://www2.camara.leg.br/english/historico/chamber-of-deputies-news-agency/imagens/mapa-pre-sal-petrobras.jpg/view>

<https://valor.globo.com/politica/noticia/2024/05/29/plataformas-podem-ficar-mais-caras-e-leiloes-de-petroleo-tendem-a-atrasar-ainda-mais-com-jabuti-diz-abespetro.ghtml>
